DIAGRAMA PUNTO DE CONEXIÓN


DATOS DE LA SOLICITUD		DATOS PUNTO DE CONEXIÓN APROBADO	
Expediente Número:	P22302026090028	Subestación:	TERNERA
Nombre Proyecto:	LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO	Circuito:	TERNERA13
Territorio:	BOLÍVAR NORTE	Nivel de Tensión:	13200 V
Carga actual del suministro (KVA):		Carga Total Aprobada (KVA):	225
Carga Solicitada (KVA):	225	Fecha de aprobación :	9/09/2026

DATOS CORTO CIRCUITO			
Trifásico		**Monofásico**	
Scc (MVA)	20,056	Scc (MVA)	3,483
Icc (kA)	0,839	Icc (kA)	0,437
R (Ohm)	5,897	R0 (Ohm)	9,392
X (Ohm)	8,621	X0 (Ohm)	39,048

CRONOGRAMA DE ENTRADA DE LA CARGA APROBADA POR CARIBEMAR DE LA COSTA

Etapa	Fecha	kVA	Total
No.1	2026	225	225

DIAGRAMA DE UBICACIÓN

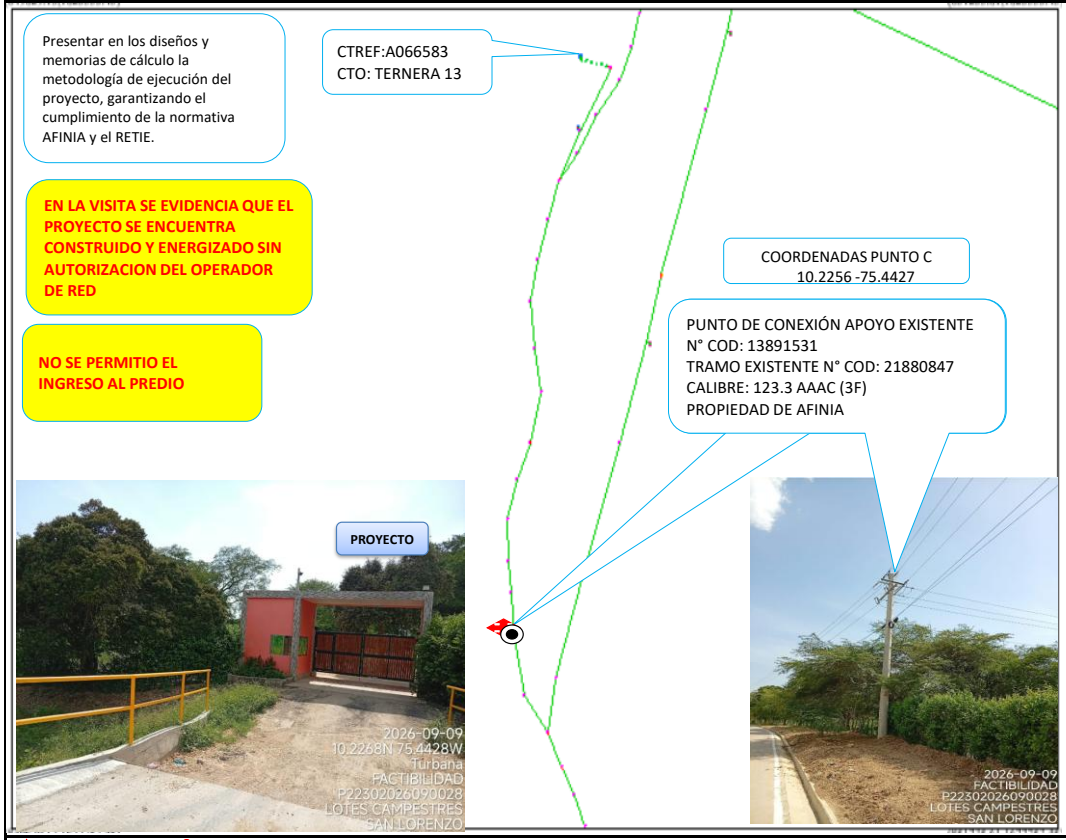

Punto de conexión
CT Poste nuevo
CT Superficie nuevo
Tablero BT
Adecuación de estructura
Cambio de estructura
Estructura existente
Paso aéreo subterráneo
Tendido acometida BT subterránea
Tendido acometida BT aérea
Tendido acometida MT subterránea
Tendido de red MT aérea
Refuerzo de red MT existente

DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS EMPRESA/ RETIE/RETILAP/RESOLUCIÓN 038-14 Y DEMÁS NORMAS QUE APLIQUEN

NOTAS PARA LA CONEXIÓN

1. LEER CARTA DE NOTIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD ADJUNTA.
2. ADECUACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN SEGÚN NORMATIVA AFINIA Y EL RETIE.
3. TENER EN CUENTA DISTANCIAS DE SEGURIDAD RETIE.
4. EL PROYECTO DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVA DEL OPERADOR DE RED.
5. **INSTALACIÓN DE CARGA 225 kVA RESIDENCIAL,**
6. DEBE PRESENTAR EN EL DISEÑO LA FORMA EN QUE SE MEDIRÁ EL PROYECTO LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA DEL OPERADOR DE RED.
7. **Presentar los cálculos mecánicos del apoyo existente. En caso de que el apoyo y estructura se encuentre en mal estado, deberá ser reemplazado.**
8. DEBE PRESENTAR EN EL DISEÑO LOS DETALLES DEL PUNTO DE CONEXIÓN ASIGNADO

OBSERVACIONES

INSTALACIÓN:

1. TODO CAMBIO Y/O ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y REDES EXISTENTES SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.
2. DEBE PRESENTAR PERMISO DE PLANEACION MUNICIPAL PARA HINCADOS DE APOYOS
3. DEBE PRESENTAR CERTIFICACIÓN PLENA RETIE.
4. ESTA FACTIBILIDAD TIENE VIGENCIA DE 365 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN (Deben solicitar la revalidación un mes antes del vencimiento de su factibilidad, para no perder la capacidad asignada inicialmente y evitar tener que reiniciar su proyecto eléctrico. En la respuesta del formato E2 se especifica la vigencia de la factibilidad.)
5 -Tener en cuenta el ancho de la zona de servidumbre para líneas de transmisión.
6 - TENER EN CUENTA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EDIFICACIONES ALEDAÑAS.
7 - LA FACTIBILIDAD SE EMITE DADA LAS CONDICIONES AL MOMENTO DE LA VISITA, CUALQUIER
MODIFICACIÓN ANTES DE LA ADECUACIÓN DEL PUNTO DE CONEXION DEBE TENERSE EN
8-TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER REVISADOS POR AFINIA ISES S.A.S ANTES DE SER INSTALADOS, DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE PRODUCTO DE CADA UNO DE ESTOS. SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE VISIBLES.

TODOS LOS TRABAJOS SE HARÁ EN CALIENTE. SI SE NECESITA REALIZAR EL DESCARGO EN FRIO SE PAGARA LA ENERGÍA DEJADA DE SUMINISTRAR Y LA COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO, CON LAS TARIFAS VIGENTES AL MOMENTO DEL DESCARGO

"1) Obtener y aportar previo a la Construcción del Proyecto los permisos de conexión y/ó Servidumbre, cuando el punto de conexión definido se encuentre ubicado en redes de propiedad Particular".

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA :

1. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. se reserva el derecho de modificar el punto de conexión otorgado al proyecto, de acuerdo con las condiciones del sistema de distribución al momento de solicitar la conexión de la carga. Los costos asociados a la modificación que se presente, deben ser asumidos por el cliente.

2. Le recordamos que para la construcción de su proyecto eléctrico debe cumplir con la gestión y presentación de los respectivos permisos que le apliquen al mismo:
- Permisos de paso y servidumbres.
- Permisos ambientales.
- Permiso especial por el Ministerio de transporte (Ley 1228 del 2008).
- Permiso de uso de red particular.
- Otros permisos que apliquen al proyecto.

REALIZADO POR: ESTEBAN GUEBELY C
